


## ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO NÚMERO 1



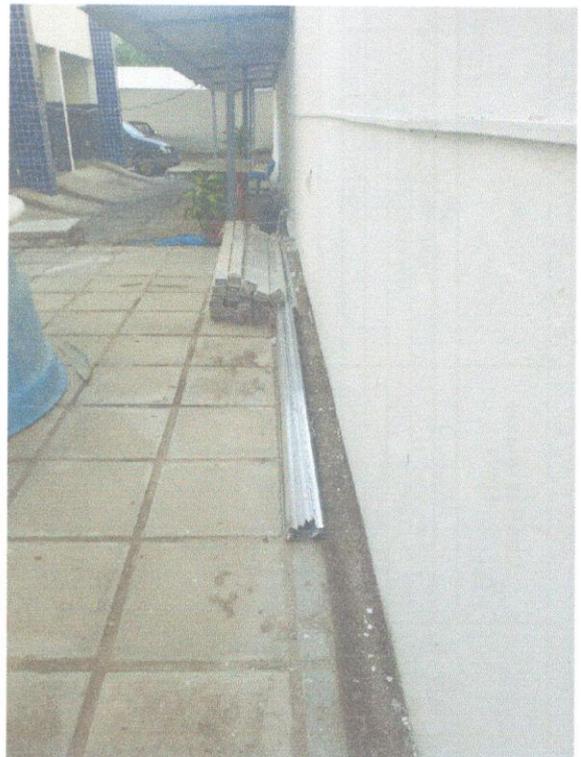

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO  
NÚMERO 01



CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA - 11.407.160/0001-76  
 CONTRATO: UNA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - 28.490.620/0001-75  
 OBJETO CONTRATO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS CONECTADO À REDE  
 Nº DO CONTRATO: 001/2024  
 DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 29 de fevereiro de 2024  
 DATA DE TÉRMINO DO CONTRATO: 120 DIAS  
 DATA DA MEDIÇÃO: \*\*\*\*\*  
 PERÍODO DESTA MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 29/03/2024

| CAT. | SERVIÇOS CONTRATADOS   | ESCOPO DO CONTRATO   |        |                |                | POSICÃO FÍSICA |       |       |         | POSICÃO FINANCEIRA |         |       |               |                |                |               |
|------|--|--|--------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|---------|--------------------|---------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|      |  | UNID.  | QUANT. | PREÇO UNIT.    | VALOR TOTAL    | ACUM ANT       | %     | ATUAL | %       | ACUM ATUAL         | %       | SALDO | ACUM ANTERIOR | MEDIÇÃO ATUAL  | ACUM. ATUAL    | SALDO         |
| 14   | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 71,68KWP.                    | UNID.  | 1,00   | R\$ 115.990,00 | R\$ 115.990,00 | -              | 0,00% | 1,00  | 100,00% | 1,00               | 100,00% | -     | 0,00%         | R\$ 115.990,00 | R\$ 115.990,00 | R\$ -         |
| 15   | INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 71,68KWP.                                  | UNID.  | 1,00   | R\$ 46.396,00  | R\$ 46.396,00  | -              | 0,00% | -     | 0,00%   | -                  | 0,00%   | 1,00  | 100,00%       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 46.396,00 |
| 16   | REALIZAÇÃO E PROTOCOLAMENTO DO PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO NA NEDERGERIA PE. | UNID.  | 1,00   | R\$ 69.594,00  | R\$ 69.594,00  | -              | 0,00% | -     | 0,00%   | -                  | 0,00%   | 1,00  | 100,00%       | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 69.594,00 |
| 17   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 18   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 19   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 20   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 21   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 22   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 23   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 24   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 25   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 26   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 27   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 28   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 29   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 30   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 31   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 32   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 33   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 34   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 35   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 36   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 37   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 38   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 39   |  |  |        |                |                |                | 0,00% |       | 0,00%   |                    | 0,00%   |       | 0,00%         |                |                |               |
| 40   | NÚMERO DA REQUISIÇÃO:  |  |        |                |                |                |       |       |         |                    |         |       |               |                |                |               |
| 41   | STATUS DA MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO:  | LIBERADO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO LIBERADO <input type="checkbox"/>   |        |                |                |                |       |       |         |                    |         |       |               |                |                |               |
| 42   | DATA DE PAGAMENTO:   | 01/04/24   |        |                |                |                |       |       |         |                    |         |       |               |                |                |               |
| 43   | OBSERVAÇÕES:   | EM ANEXO FOTOS DA ENTREGA DO MATERIAL  |        |                |                |                |       |       |         |                    |         |       |               |                |                |               |
| 44   |  | BANCO: 748 SICREDI - SERRA TALHADA<br>AGÊNCIA: 2206<br>TIPO DE CONTA: CONTA CORRENTE Nº CONTA: 10092-7<br>CNPJ / CPF: 28.490.620/0001-75<br>UNA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA<br>***** |        |                |                |                |       |       |         |                    |         |       |               |                |                |               |
| 45   |  | CONTRATANTE  |        |                |                |                |       |       |         |                    |         |       |               |                |                |               |
| 46   |  | DE ACORDO: 01/04/24  |        |                |                |                |       |       |         |                    |         |       |               |                |                |               |
| 47   |  | CONTRATADO   |        |                |                |                |       |       |         |                    |         |       |               |                |                |               |

| RETENÇÃO CONTRATUAL ACUMULADA ANTERIOR: (10%) |                |
|---|----------------|
| VALOR BRUTO DO BIM                            | R\$ 115.990,00 |
| DESCONTOS                                     | R\$ -          |
| RET. CONT DESTA BIM (10%)                     | R\$ -          |
| VALOR LÍQUIDO A PAGAR                         | R\$ 115.990,00 |
| APROVAÇÃO:                                    |                |
